

SECOM - Secretaría Nacional de Comunicación
Subsecretaría de Medios Institucionales
Dirección de Contenidos de Medios Institucionales
PROYECTO: K003 Radio Ciudadana

Líder del Proyecto:	Arboleda Palma, Jorge Ricardo (jorge.arboleda@secom.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Arboleda Palma, Jorge Ricardo	Programas Relacionados:	REHABILITACION DE RADIO CIUDADANA CON COBERTURA EN ECUADOR CONTINENTAL EN FRECUENCIA AM
Titular:	Novoa Oquendo, Christian Geovanny	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30200000.0000.373959	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,853,789.05
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Arboleda Palma, Jorge Ricardo	Fecha del siguiente Hito:	03/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto plantea rehabilitar la anteriormente conocida Radio Nacional y que actualmente se la ha denominado "Radio Ciudadana" con cobertura en Ecuador continental en frecuencia AM, en virtud de que el equipamiento existente ha cumplido su vida útil y es necesario renovarlo con tecnología moderna que permita entre otros aspectos: Mejorar y ampliar la cobertura, permitir el acceso y comunicación hacia la señal de las estaciones, mejorar la sintonía especialmente en regiones rurales alejadas.

La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando para fines de este proyecto como las edades que tienen el hábito de escuchar al menos un programa de radio en el día, a nivel nacional y que se pueden beneficiar de los programas que emprende el gobierno para el beneficio de la comunidad.

La cobertura de la Radio Ciudadana antes de iniciado el proyecto de rehabilitación era aproximadamente un 5% del territorio nacional.

Objetivo General o Propósito
 Rehabilitar RADIO CIUDADANA con cobertura nacional en Amplitud Modulada

Objetivo Específicos o Componentes
 .Desarrollar la Infraestructura física radial de forma estratégica para una cobertura nacional.
 .Implementar equipos técnicos de comunicación y transmisión actualizados y funcionando.
 .Contratar capital humano especializado, capacitarlo en nuevas tecnologías y con uso de servicios complementarios.

Beneficios Cualitativos

Contribuir a mejorar los niveles de información y comunicación a todo el territorio nacional continental de forma oportuna acorde los intereses de los sectores involucrados.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo son los y las ciudadanas a partir de los 16 años de edad, considerando para fines de este proyecto como las edades que tienen el hábito de escuchar al menos un programa de radio en el día, a nivel nacional y que se pueden beneficiar de los programas que emprende el gobierno para el beneficio de la comunidad.


Restricciones

TIEMPO: 4 años
 COSTO: \$ 13.380.180,56
 ALCANCE: Nacional
 Recursos: Humanos, materiales, equipos e infraestructura.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.73 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

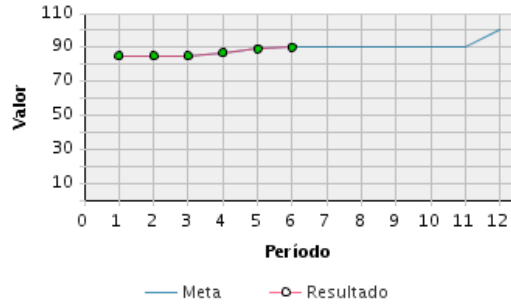

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	85 %	85 %	85 %	87 %	89 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	85 %	85 %	85 %	87 %	89 %	90 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2018: En cumplimiento de los objetivos institucionales del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana durante mayo del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el mes de julio de 2018 se han realizado varias transmisiones en vivo, las cuales corresponden a eventos dónde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.</p> <p>Las siguientes son transmisiones en vivo realizadas en el mes por Radio Ciudadana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Recibimiento con honores al Emir de Catar Jeque Tamim Bin Hamad al Thani. 2) Imposición de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Collar al Emir de Catar. 3) Rueda de prensa sobre los "Avances en la Ley de Fomento Productivo y proyectos de cooperación con PNUD". 4) Socialización de dos proyectos que emprende el Gobierno Nacional en el ámbito cultural, artístico y musical. 5) Reunión con rectores de universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. 6) Rueda de prensa del Señor Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 7) Rueda de prensa de la presentación del proyecto turístico Tren Playero. 8) Rueda de prensa de la visita del relator de la ONU para la protección de la libertad de expresión y opinión David Kaye. 	Arboleda Palma, Jorge Ricardo	05/11/2018 - 12:19 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9) World Business Forum Capítulo Ecuador. 10) Declaraciones del Señor Canciller respecto de la situación de los migrantes venezolanos. 11) Encuentro con nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 12) Rueda de prensa en la que se presentarán las últimas cifras de empleo, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). 13) Encuentro del Señor Presidente con organizaciones sociales. 14) Reunión con la CONAGOPARE. 15) Evento: Construimos Empleo y Prosperidad. 16) Rueda de prensa de los Ministerios de Justicia, Interior y Comunicación sobre el caso Alvarado. 17) Declaraciones de prensa sobre la Audiencia del Señor Presidente con Ana Peláez y otros representantes del Grupo Social Once. 18) Reunión del Señor Presidente de la República con representantes de los Poderes del Estado. 19) Desayuno de trabajo de la Presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 20) Rueda de prensa sobre la visita el Grupo Social ONCE al Ecuador.</p>		
<p>Septiembre 2018: En cumplimiento de los objetivos institucionales del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana durante mayo del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el mes de julio de 2018 se han realizado varias transmisiones en vivo, las cuales corresponden a eventos dónde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.</p> <p>Las siguientes son transmisiones en vivo realizadas en el mes por Radio Ciudadana: 1) Rueda de prensa de la reunión entre el Secretario General de la Presidencia Eduardo Jurado y María Paula Romo. 2) Rueda de prensa del "Encuentro regional por la Movilidad Humana". 3) Declaraciones del secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, sobre la posición del Gobierno Nacional ante importante litigio Internacional. 4) Reunión del presidente Lenin Moreno con Delegación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 5) Firma del convenio con la conferencia Episcopal Ecuatoriana para la formación técnica y tecnológica. 6) Inauguración de la Feria Internacional Expo Flor Ecuador 2018. 7) Rueda de prensa sobre las acciones del Gobierno Nacional para reducir los siniestros de tránsito. 8) Día Mundial del Turismo y Firma del Convenio con el CONADIS.</p>	<p>Arboleda Palma, Jorge Ricardo</p>	<p>05/11/2018 - 11:23 AM</p>
<p>Agosto 2018: En cumplimiento de los objetivos institucionales del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana durante mayo del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p>	<p>Arboleda Palma, Jorge Ricardo</p>	<p>06/09/2018 - 11:07 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el mes de julio de 2018 se han realizado varias transmisiones en vivo, las cuales corresponden a eventos dónde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.</p> <p>Las siguientes son transmisiones en vivo realizadas en el mes por Radio Ciudadana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inauguración de la exposición "Artesano - Artista: Tradición y creación" 2. Rueda de prensa tras la reunión del Señor Presidente con los representantes del BID 3. Entrega oficial del Premio Nacional Eugenio Espejo, en Conmemoración al Día Nacional de la Cultura 4. Contacto ciudadano del Presidente de la República 5. Declaraciones de prensa tras audiencia del Señor Presidente con el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Japón 6. Entrega de resultados del examen nacional de evaluación Ser Bachiller 7. Ceremonia de Entrega de la fase Jacinta Sandiford del Parque Samanes 8. Rueda de prensa sobre las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno Nacional 9. Participación del Primer Mandatario en el evento de fortalecimiento del proyecto "Pacto por el Empleo Juvenil". 10. Rueda de prensa sobre la situación de los ciudadanos venezolanos en el Ecuador 11. Encuentro por los 50 años del Seguro Social Campesino 12. Rueda de prensa por inicio de clases régimen Sierra y Amazonía 2018 - 2019 13. Inauguración de la XXIV Feria Internacional Quito Construcción 14. Firma del Acuerdo Ministerial que asegura el pago por compensación jubilar al sector público 15. Promoción de estudiantes de la Fase 1, campaña Todos ABC Monseñor Leonidas Proaño. 		
<p>Julio 2018:</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana durante mayo del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el mes de julio de 2018 se han realizado varias transmisiones en vivo, las cuales corresponden a eventos dónde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.</p> <p>Las siguientes son transmisiones en vivo realizadas en el mes de julio por Radio Ciudadana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesión solemne por el 51 aniversario de la cantonización Santo Domingo 2. Declaraciones de prensa respecto de la orden judicial en contra del ex Presidente de la República 3. Firma del Decreto para la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. 4. Encuentro Ciudadano con las brigadistas de la Misión Manuela Espejo 5. Rueda de prensa del Ministerio de Comercio Exterior desde el Swissotel 6. Rueda de Prensa desde SECOM sobre las estadísticas de desempleo y pobreza en el Ecuador 7. Minga Agropecuaria, entrega de títulos y créditos productivos 8. Foro construyendo igualdad desde la Universidad Simón Bolívar Quito 9. Feria de presentación del programa "Impulso Joven". 	<p>Arboleda Palma, Jorge Ricardo</p>	<p>06/09/2018 - 11:03 AM</p>
<p>1.ANTECEDENTES</p> <p>De acuerdo a las necesidades de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), la Subsecretaría de Medios Institucionales realiza transmisiones en vivo de la agenda de actividades de la Función Ejecutiva, así como de eventos de interés nacional, en este contexto se traslada personal técnico y periodístico hacia los diferentes sitios donde se requiera realizar las transmisiones.</p>	<p>Vallejo Villacres, Elizabeth Andrea</p>	<p>04/07/2018 - 09:58 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La realización de una transmisión en vivo es dispuesta por las autoridades de la SECOM. Una vez que se cuenta con la disposición de una transmisión, se trabaja coordinadamente con diferentes áreas de la institución a fin de llevar a cabo las tareas requeridas.</p> <p>La señal generada en exteriores se recibe en los estudios para posteriormente ser emitida al aire a través de las estaciones transmisoras y las diferentes plataformas digitales (streaming, página web, app).</p> <p>2.CONTENIDO/ANÁLISIS TÉCNICO</p> <p>Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano y de manera oportuna acerca de las acciones y gestiones emprendidas por el Gobierno Nacional en favor de los mandantes, en el mes de junio de 2018 se han realizado seis transmisiones en vivo, cuatro de éstas corresponden a eventos dónde ha intervenido el Señor Presidente de la República y eventos de interés nacional organizados por estamentos de la Función Ejecutiva.</p> <p>En la siguiente tabla se refleja el detalle de las transmisiones realizadas en junio:</p> <p>No.FechaEventoResponsable del EventoPeriodistaTécnicoMedio 120-Jun-18Encuentro con el Cine EcuatorianoINCINEAndrea VallejoJavier Mena / Santiago CadenaRadio Ciudadana 227-Jun-18Declaraciones del Señor Canciller respecto del arribo de los cuerpos del personal periodístico de "El Comercio"Ministerio de Relaciones Exteriores - SECOMCarlos ProañoDavid Chávez / Santiago CadenaRadio Ciudadana 328-Jun-18Saludo Protocolar con el Señor Vicepresidente de Estados UnidosPRESIDENCIA - SECOMAndrea Vallejo / Carlos ProañoDavid ChávezRadio Ciudadana 428-Jun-18Declaraciones conjuntas del Señor Presidente del Ecuador y Señor Vicepresidente de Estados UnidosPRESIDENCIA - SECOMCarlos Proaño David ChávezRadio Ciudadana 529-Jun-18Rueda de Prensa de Señores Ministros de Estado sobre los resultados de la visita del Señor Vicepresidente de los Estados UnidosPRESIDENCIA - SECOMCarlos ProañoDavid Chávez / Santiago CadenaRadio Ciudadana 613-June-18Conversatorio del Señor Presidente con medios de comunicación en la provincia de NapoPRESIDENCIA - SECOMNelson López / David ChávezUnidad Móvil - Tele Ciudadana</p>		
<p>MAYO 2018</p> <p>En cumplimiento de los objetivos institucionales del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana durante mayo del presente año se cumplieron las actividades regulares que a nivel informativo corresponden a estos medios públicos oficiales.</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Acorde al Contrato N° 034-2016-SECOM de fecha 10 de noviembre de 2016, suscrito entre la Secretaría Nacional de Comunicación - CONTRATANTE y la empresa Audio, Video y Comunicaciones Cía. Ltda. - CONTRATISTA; por la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN FM PARA RADIO CIUDADANA, se planificó y realizó el recorrido para realizar las correcciones de observaciones dadas en el recorrido de mantenimiento preventivo del equipamiento de la cabina de la cabina de Guayaquil de Radio Ciudadana y del equipamiento de radiofrecuencia del transmisor FM que cubre la ciudad de Cuenca, Loja, Guayaquil y Manta, dado en el mes de abril.</p> <p>En el mes de mayo el área técnica operativa ha realizado, además de las funciones propias que permiten garantizar la operatividad de los medios de comunicación, los procesos faltantes de registro público de medios y rendición de cuentas antes el CORDICOM, dando cumplimiento a la normativa regulatoria vigente.</p> <p>Otras actividades administrativas desarrolladas son las siguientes:</p> <p>.Se realizó actividades de coordinación y supervisión de los equipos de radiofrecuencia de Radio Ciudadana.</p>	<p>Vallejo Villacres, Elizabeth Andrea</p>	<p>04/07/2018 - 09:58 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Se desarrollaron actividades de elaboración de informes para avanzar con el proceso de mantenimiento del proceso de streaming de Radio Ciudadana.</p> <p>En la Radio Ciudadana se realizaron las siguientes transmisiones de la Función Ejecutiva:</p> <p>Posesión de nuevos ministros Informe a la Nación Primer año de Gobierno</p> <p>Tipo de TransmisiónNúmero Eventos2 TOTAL2</p>		
<p>Informe de Gestión del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana y del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva</p> <p>ABRIL DEL 2018</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Durante abril se realizaron 8 transmisiones por El Ciudadano Tv, 12 por radio La Ciudadana, 20 productos gráficos, 86 programas radiales, 368 fotografías, 20 galería fotográficas, 4 El Presidente Informa, 112 productos audiovisuales (insumos para la cadena nacional), 58 coberturas de las actividades del Presidente de la República y de interés presidencial, 9 producciones gráficas para la cadena, 9 vídeos para otras instituciones públicas, 5 cuñas radiales para otras instituciones públicas, 5 locuciones para la Vicepresidencia de la República, 32 infochannels, 814 micro informativos, 3 coberturas y 4 transmisiones a través de nuestros medios.</p>	<p>Khalife Moraga, Galo Miguel</p>	<p>07/05/2018 - 09:08 AM</p>
<p>Informe de Gestión del Proyecto de Rehabilitación Radio Ciudadana y del Proyecto Implementación de El Ciudadano TV 48,49, canal de televisión de la Función Ejecutiva</p> <p>ENERO DE 2018</p> <p>Como está establecido en la estructura vigente de estos medios, la mayor parte de los esfuerzos se destina a cumplir con labores informativas, a través de diferentes espacios diseñados para este objetivo. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto recurrente de nuestros medios de comunicación que presta un servicio que aprovechan, sobre todo y con mayor realce, los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así, que cumplimos con la labor de difundir el trabajo de los estamentos de la Función Ejecutiva que por mandato institucional nos corresponde.</p> <p>Se realizaron 23 transmisiones en El Ciudadano Tv y 20 en radio La Ciudadana.</p> <p>FEBRERO DE 2018</p> <p>En cumplimiento al mandato institucional que nos corresponde y acorde a lo establecido en la estructura vigente de los mencionados medios públicos oficiales, gran parte del trabajo realizado acorde a las necesidades y requerimientos de la Función Ejecutiva se han encaminado a las labores informativas desde distintos espacios. Las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno son un producto permanente de los medios de comunicación oficiales para además de transmitir directamente a la ciudadanía, se proporciona información oficial de la Función Ejecutiva a los medios de comunicación con menos recursos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional y no cuentan con la capacidad técnica ni operativa para cubrir todos los acontecimientos de la coyuntura nacional.</p> <p>Se realizaron 7 transmisiones en El Ciudadano Tv y 11 en radio La Ciudadana.</p> <p>MARZO DE 2018</p>	<p>Khalife Moraga, Galo Miguel</p>	<p>07/05/2018 - 09:06 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Además de cumplir con las transmisiones de las actividades del Señor Presidente de la República del Ecuador, de la Señora Vicepresidenta y de otros altos dignatarios del Gobierno, se realizó el mantenimiento preventivo del equipamiento de la cabina de la cabina principal de Radio Ciudadana y del equipamiento de radiofrecuencia del transmisor FM que cubre la ciudad de Quito y sus alrededores, en este mantenimiento se capacitó al personal del área técnica para un soporte de primer nivel. Se realizaron 9 transmisiones en El Ciudadano Tv y 3 en radio La Ciudadana.		
DICIEMBRE 2017 - Se realizó mantenimiento preventivo a las estaciones de radiodifusión FM . Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Khalife Moraga, Galo Miguel	04/01/2018 - 02:52 PM
NOVIEMBRE 2017 - Se realizó mantenimiento preventivo a las estaciones de radiodifusión AM de las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja, así como se implementó un enlace entre SECOM y Cerro Pichincha para monitorear de los transmisores FM en dicho Cerro. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Acaro Vega, Christian Fernando	01/12/2017 - 09:41 AM
OCTUBRE 2017 - Se implementaron dentro de la parrilla de programación programas de nuevas instituciones del Estado a fin de que puedan dar a conocer a la ciudadanía los avances que se realizan en cada una de sus áreas. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Acaro Vega, Christian Fernando	01/11/2017 - 01:05 PM
SEPTIEMBRE 2017 - Se realizó la instalación de un comrex y teléfono hibrido en la cabina de radio ciudadana de la ciudad de Guayaquil, a fin de poder recibir señales de contribución desde territorio, así como se modificó la parrilla de programación incluyéndose programas de las Instituciones del Estado. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Acaro Vega, Christian Fernando	02/10/2017 - 03:01 PM
AGOSTO 2017 - Se realizó el mantenimiento de equipos de estudio y planta transmisora de Vergeles, así como se modificó la parrilla de programación incluyéndose programas de las Instituciones del Estado como por ejemplo ECU911, Ministerio del Interior, Gobernación, Ministerio de Turismo, etc. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Acaro Vega, Christian Fernando	01/09/2017 - 03:06 PM
JULIO 2017 - Se realizó el cambio de frecuencia en la ciudad de Guayaquil a la nueva frecuencia 97.7 MHz asignada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/08/2017 - 08:32 AM
JUNIO 2017 - Se realizó la reubicación de los estudios de radio Ciudadana Guayaquil del piso 14 del gobierno zonal a el edificio de El Telégrafo. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/07/2017 - 10:54 AM
MAYO 2017 - Se aprobó la modificación de parámetros técnicos de las 5 estaciones FM y se solicitó la suscripción del acta de puesta en operación definitiva con el Organismo de Control. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/06/2017 - 02:42 PM
ABRIL 2017 - Se solicitó la modificación de parámetros técnicos de las 5 estaciones FM, a fin de poder en el mes de mayo suscribir el acta de puesta en operación definitiva con el Organismo de Control. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/05/2017 - 04:18 PM
MARZO 2017 - Se puso al aire el nuevo sistema de estudios y transmisión y se reubico la cabina de la ciudad de Guayaquil (Actualmente estamos ubicados en el Gobierno Zonal, piso 14). Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/04/2017 - 04:37 PM
FEBRERO 2017 - Se encuentra instalados los equipos de las estaciones repetidoras de radio Ciudadana FM en las ciudades de Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manta y Portoviejo. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Acaro Vega, Christian Fernando	02/03/2017 - 04:29 PM
ENERO 2017 - Se encuentra instalados los equipos de cabina en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como se espera hasta mediados del mes de febrero se instalen los equipos las estaciones repetidoras en las ciudades de Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manta y Portoviejo.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/02/2017 - 12:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía		
DICIEMBRE 2016 - Se depositó por parte del Ministerio de Finanzas el anticipo por la compra de equipos para Radio Ciudadana FM, lo que permitirá que hasta inicios del mes de febrero de 2017 se cuenten con equipos propios para las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta y Portoviejo. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía	Acaro Vega, Christian Fernando	03/01/2017 - 03:27 PM
NOVIEMBRE 2016 - Se firmó el contrato de compra de equipos para Radio Ciudadana FM y se realizaron transmisiones especiales por la visita del presidente de China y por el Festival de las Artes Vivas. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/12/2016 - 10:02 AM
OCTUBRE 2016 - Se adjudicó el contrato de compra de equipos para Radio Ciudadana FM y se realizaron mantenimientos a los equipos transmisores en la ciudad de Guayaquil, así como se realizó una modificación a la parrilla de programación que se ejecutara desde el 01 de noviembre, a fin de que la misma sea más atractiva para la ciudadanía. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	01/11/2016 - 11:42 AM
SEPTIEMBRE 2016 - Se cuenta con toda la documentación para el inicio del proceso de comprar definitiva de los equipos para Radio Ciudadana FM, se tiene previsto la publicación del proceso para el 03 de octubre de 2016, a fin de hasta finales de año contar con el equipamiento propio instalado y operado. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/10/2016 - 01:16 PM
AGOSTO 2016 - Se cuenta con el aval del Ministerio de Finanzas, certificaciones presupuestarias, TDR y estudio de mercado para la comprar definitiva de los equipos para Radio Ciudadana FM, así como se realizó la factibilidad técnica para la reubicación de los estudios en la ciudad de Guayaquil desde la Gobernación al edificio del Gobierno Zonal. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/09/2016 - 11:08 AM
JULIO 2016 - En este mes se lanzó el proceso para la contratación de Pastillas Comunicacionales para Radio Ciudadana y está en fase de adjudicación, por otra parte se elaboraron los términos de referencia y el estudio de mercado para la adquisición de equipos de transmisión para Radio Ciudadana FM, se gestionó además nuevas oficinas para la reubicación de los estudios de Radio Ciudadana en Guayaquil. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	02/08/2016 - 04:24 PM
JUNIO 2016 - En este mes realizó la reubicación del equipamiento desde el edificio Huancavilca hasta las instalaciones de Vergeles, así como se realizó un incremento en la capacidad de enlaces de internet, a fin de mejorar la calidad de audio del sistema FM y evitar cortes en la emisión de la señal al aire. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	01/07/2016 - 03:24 PM
MAYO 2016 - En este mes se obtuvo la autorización respectiva por parte de ARCOTEL para el sistema de Radiodifusión sonora FM y se inició operaciones el 24 de mayo en las ciudades de Quito (106.5 Mhz), Loja (106.9 Mhz), Manta y Portoviejo (100.1 Mhz) y Cuenca (93.7 Mhz), así como se instaló los equipos en la ciudad de Guayaquil (94.9 Mhz). Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/06/2016 - 09:53 AM
ABRIL 2016 - Las actividades que se realizaron durante el mes de abril estuvieron orientadas a la implementación de la radio en FM, por lo que se logró el nuevo dictamen de prioridad por parte de SENPLADES y se presentó la solicitud de frecuencias para servir a las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Cuenca y Loja. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/05/2016 - 02:58 PM
MARZO 2016 - Las actividades que se realizaron durante el mes de marzo fueron el inicio de los procesos de contratación para la implementación de Radio Ciudadana FM, a fin de poder implementar en un corto plazo dicho sistema. Adicionalmente se realizaron transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/04/2016 - 04:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2016 - Las actividades que se realizaron durante el mes de febrero fueron la aprobación del presupuesto PAI para todo el año, en las cuales se identificaron todas las actividades procesos y recursos necesarios para cubrir a cabalidad las metas y objetivos del proyecto propuestos para el 2016. Se realizaron 30 transmisiones en vivo de las actividades del Sr. Presidente con previas, entrevistas, vocerías desde territorio a fin de informar de forma verás a la ciudadanía. La señal de radio ciudadana fue matriz para decenas de radios a nivel nacional durante las actividades del señor Presidente	Acaro Vega, Christian Fernando	16/03/2016 - 10:52 AM
ENERO 2016. Durante este mes se realizó la planificación de actividades del proyecto para el año 2016, de manera concomitante con las metas del proyecto y el presupuesto disponible. Las tareas a ser realizadas se ven reflejadas en los hitos que forman parte de esta herramienta	Acaro Vega, Christian Fernando	15/02/2016 - 03:32 PM
DICIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM, realizándose en el año alrededor de 320 transmisiones.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/01/2016 - 03:39 PM
NOVIEMBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente, se actualizó el equipamiento para la copia de la programación que lo establece la Ley.	Acaro Vega, Christian Fernando	04/12/2015 - 02:41 PM
OCTUBRE 2015: En el área de operaciones, se han cumplido con todas las transmisiones requeridas por parte de Presidencia y las actividades propias de SECOM. Adicionalmente, se realizó mantenimiento preventivo del equipamiento en cabina de Quito y Guayaquil y correctivo de la torre de transmisión de la ciudad de Guayaquil, así como se inició el proceso para las adecuaciones del sitio en la ciudad de Quito donde se instalará el nuevo transmisor.	Acaro Vega, Christian Fernando	05/11/2015 - 04:07 PM
SEPTIEMBRE 2015: A la presente fecha dentro del convenio SECOM - SECOB la transferencia de fondos se encuentra en el Ministerio de Finanzas, adicionalmente dentro de la compra del transmisor para la ciudad de Quito el contrato fue suscrito con la empresa ganadora de la subasta inversa electrónica y estamos a la espera de la aprobación del Ministerio de Finanzas para realizar la respectiva transferencia del anticipo. Finalmente el trámite para las adecuaciones del sitio donde se instalará el nuevo transmisor, se tiene planificado que hasta el 09 de octubre se lance en el portal dicha contratación y de esta manera tener listas las adecuaciones para la instalación y operación del nuevo transmisor.	Acaro Vega, Christian Fernando	05/10/2015 - 03:15 PM
AGOSTO 2015: A la presente fecha se ha dado cumplimiento a los 3 hitos establecidos para este mes, pues se ha contratado las pastillas comunicaciones previstas, mientras que en lo relacionado al convenio SECOM - SECOB se cuenta con el pedido de transferencia de fondos de parte de SECOM a SECOB a fin de que se ejecuten las obras. Por otra parte, se informa sobre el estado de diversos procesos que el proyecto lleva a cabo.	Acaro Vega, Christian Fernando	03/09/2015 - 01:01 PM
JULIO 2015: A la presente fecha se han tenido que realizar algunas modificaciones en la ejecución del proyecto, en razón de que existió una reducción en el presupuesto, sin embargo las mismas han sido consideradas para el siguiente año. Adicionalmente se continúa con el proceso de adquisición del equipo transmisor para cubrir a la ciudad de Quito con una señal de muy buena calidad, mismo que entrará en operación en diciembre del presente año.	Acaro Vega, Christian Fernando	05/08/2015 - 05:59 PM
JUNIO 2015: Debido a la salida del Líder del Proyecto se debió reprogramar las fechas estimadas de los 2 hitos correspondientes al periodo, se espera la contratación del nuevo líder en los siguientes días para continuar el desarrollo de las actividades planificadas en el proyecto.	Proaño Bravo, Roberto Carlos	06/07/2015 - 09:51 AM
MAYO 2015: Se realizó la reprogramación de las fechas de los hitos del proyecto de acuerdo a los lineamientos de la SNAP emitidas en el Oficio Nro. SNAP-SCG-2015-000279-O con el fin de alcanzar los resultados esperados en calidad y costo.	García Santos, Jorge Mauricio	05/06/2015 - 04:59 PM
ABRIL 2015: Proceso de Consultoría, se firma contrato con el proveedor el 30 de abril, en espera de los productos de estudios técnicos para Rehabilitar estación transmisora de Puengasí y lanzar un nuevo proceso de Adecuación civil. Se presenta informe de cobertura a las Autoridades. Se recibió la consultoría de diseño de oficinas de GYE y LOJA a cargo de SECOB, se está analizando el presupuesto y cronograma planteado para proceder con la firma del nuevo convenio de Cooperación. Se continúa trabajando en los estudios técnicos para la implementación de nuevos equipos de comunicación para las cabinas de Radio en Guayaquil y Loja, una vez remodelado las oficinas.	Sosa Sosa, María Valeria	05/05/2015 - 02:44 PM
Marzo 2015: Proceso de Consultoría para los estudios de la Planta de Puengasí declarado desierto, se vuelve a lanzar el proceso el 30 de marzo. Se presentará informe de nuevas coberturas e inversiones para la Radio. Se recibió la consultoría de diseño de oficinas de GYE y LOJA a cargo de SECOB, se está analizando el presupuesto y cronograma planteado para proceder con la firma del nuevo convenio de Cooperación.	Sosa Sosa, María Valeria	02/04/2015 - 04:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2015:</p> <p>Elaboración de TDRs y Estudios de Mercado para los procesos programados de acuerdo a cronograma, terminación de cabina de producción en la Cabina de la Vicepresidencia de Radio Ciudadana, reformas presupuestarias debido a variaciones en los precios referenciales de procesos. No se recibe todavía la consultoría de diseño de oficinas de GYE y LOJA a cargo de SECOB.</p>	Sosa Sosa, María Valeria	10/03/2015 - 01:39 PM
<p>Enero 2015:</p> <p>Planificación operativa y presupuestaria del proyecto para el período 2015 de acuerdo a la asignación presupuestaria, se definen procesos de adquisiciones con sus responsables y cronogramas y se inicia elaboración de TDRs y Estudios de Mercado. Se inicia la instalación de una cabina de producción en la Cabina de la Vicepresidencia de Radio Ciudadana.</p>	Sosa Sosa, María Valeria	05/02/2015 - 11:31 PM
<p>Diciembre 2014:</p> <p>- Se culminaron actividades adicionales del proveedor de instalación de transmisores y adecuaciones temporales para las casetas de GYE ya que se debió bajar la altura de la antena en la planta de GYE. Se elaboraron y firmaron actas de entrega-recepción de todas las actividades técnicas para solicitar el pago final al proveedor.</p>	Sosa Sosa, María Valeria	05/01/2015 - 05:56 PM
<p>Noviembre 2014:</p> <p>- Se culminaron actividades de instalación de transmisores y adecuaciones temporales para las casetas de GYE y LOJA. Se realizó adicionalmente el comisionamiento (encendido) y capacitación de los dos sistemas de Transmisión al grupo de técnicos delegados por las autoridades de la Institución.</p>	Sosa Sosa, María Valeria	04/12/2014 - 11:25 AM
<p>Octubre 2014:</p> <p>- Se iniciaron actividades de instalación de transmisores y adecuaciones temporales para las casetas de GYE y LOJA.</p>	Sosa Sosa, María Valeria	04/11/2014 - 12:18 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 7, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
3	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
4	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
5	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Cronograma de instalación de trasmisores GYE y Loja validado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	1.6
2	EJECUCIÓN: Avances del proyectos de Enero a Septiembre de 2014 recibidos	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	16.0
3	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Octubre elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Noviembre elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.8
5	EJECUCIÓN: Informe de consultoría de diseño de oficinas de GYA y Loja por parte de SECOB validado y entregado	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.8
6	EJECUCIÓN: Instalación de transmisores GYE y Loja entregada	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.8
7	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Diciembre elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.8
8	EJECUCIÓN: Procesos de contratación liquidados	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.8
9	CIERRE: Informe de cierre	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.8
10	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Enero elaborado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.8
11	EJECUCIÓN: Programación Indicativa Anual de Proyecto elaborada	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.8
12	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Febrero elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.8
13	EJECUCIÓN: Proceso de transmisor Quito cargado en el portal	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.8
14	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Marzo elaborado	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.6
15	EJECUCIÓN: Proceso de transmisor Quito adjudicado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.8
16	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Abril elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.8
17	EJECUCIÓN: Procesos de infraestructura de oficinas de GYE y Loja cargado en el portal	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.8
18	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Mayo elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.8
19	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Junio elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.8
20	EJECUCIÓN: Informe de avance semestral elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.8
21	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	proyecto del mes de Julio elaborado							
22	EJECUCIÓN: Informe firmado de contratación de pastillas comunicacionales para mejorar la grilla de programación	5-Entregables Intermedios	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.6
23	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Agosto elaborado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.8
24	EJECUCIÓN: Convenio firmado SECOB - SECOM para adecuación de infraestructura de oficinas de GYE y Loja	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	1.6
25	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del convenio SECOB - SECOM para adecuación de infraestructura de oficinas de GYE y Loja	5-Entregables Intermedios	25/09/2015		25/09/2015		Sí	0.8
26	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Septiembre elaborado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.6
27	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento y trabajos técnicos para el equipamiento de la radio	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/09/2015		Sí	0.8
28	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Octubre elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	1.6
29	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del convenio SECOB - SECOM para adecuación de infraestructura de oficinas de GYE y Loja	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.8
30	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Noviembre elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.8
31	EJECUCIÓN: Instalación de transmisores Quito entregada	5-Entregables Intermedios	10/12/2015		10/12/2015		Sí	0.8
32	EJECUCIÓN: Informe de análisis de nueva cobertura de la radio	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/12/2015		23/12/2015		Sí	0.8
33	EJECUCIÓN: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Diciembre elaborado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.8
34	EJECUCIÓN: Informe de planificación anual entregado	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	1.6
35	EJECUCIÓN: TDRs de Streaming elaborados	1-Solicitud de Información	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.8
36	EJECUCIÓN: TDRS de Arrendamiento de sistemas de radiodifusión	2-Publicación de Pliegos	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.8
37	EJECUCIÓN: Servicio de Streaming adjudicado	3-Adjudicación	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.8



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
38	EJECUCIÓN: Arrendamiento de sistemas de radiodifusión adjudicado	3-Adjudicación	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.8
39	EJECUCIÓN: Equipos de radiodifusión reubicados	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	4.0
40	EJECUCIÓN: Servicio de Streaming contratado	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		30/07/2016		Sí	4.0
41	EJECUCIÓN: Sistemas de radiodifusión arrendados	5-Entregables Intermedios	15/08/2016		15/08/2016		Sí	4.0
42	EJECUCIÓN: TDRs para la producción de pastillas informativas elaborados	4-Inicio de Trabajo	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.8
43	EJECUCIÓN: Producción de pastillas informativas contratadas	4-Inicio de Trabajo	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.8
44	EJECUCIÓN: Informe del servicio de Streaming funcionando entregado	5-Entregables Intermedios	30/10/2016		30/10/2016		Sí	1.6
45	EJECUCIÓN: Informe del Arrendamiento de sistemas de radiodifusión	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.8
46	EJECUCIÓN: Informe anual del proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.8
47	EJECUCIÓN: Informe firmado de catalogación y automatización de contenidos de Radio Ciudadana, instalación de nuevas consolas de audio y NAS para el Proyecto	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.8
48	EJECUCIÓN: Presupuesto anual aprobado para el Proyecto de Radio Ciudadana	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.8
49	EJECUCIÓN: Convenio firmado con RTV Ecuador para la operación de 5 estaciones de Radio Ciudadana en su Infraestructura	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.8
50	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (I Cuatrimestre)	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.8
51	EJECUCIÓN: Informe firmado de activación del servicio de Streaming de Radio Ciudadana	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.8
52	EJECUCIÓN: Informe firmado de habilitación de enlaces de datos de respaldo y Monitoreo para todos los enlaces de datos de Radio Ciudadana	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.8
53	EJECUCIÓN: Contrato firmado de Adquisición, instalación y puesta en marcha de 5 estaciones de Radio FM adjudicado	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	3.2
54	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (II Cuatrimestre)							
55	EJECUCIÓN: Informe firmado de instalación de nuevos equipos COMREX para la señal de contribución a nivel nacional	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.8
56	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento a los Equipos de Cabinas para Radio Ciudadana en Quito, Guayaquil y Loja	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.8
57	EJECUCIÓN: Informe firmado de mantenimiento preventivo de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (III Cuatrimestre)	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.8
58	EJECUCIÓN: Informe firmado de cumplimiento de metas del cuatrimestre.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.8
59	EJECUCIÓN: Enlaces de datos de respaldo y monitoreo para Radio Ciudadana habilitados.	5-Entregables Intermedios	30/01/2018		30/01/2018		Sí	2.0
60	EJECUCIÓN: Presupuesto anual aprobado para el Proyecto de Radio Ciudadana.	5-Entregables Intermedios	30/01/2018		30/01/2018		Sí	3.0
61	EJECUCIÓN: Mantenimiento preventivo realizado de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (I Cuatrimestre).	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	2.0
62	EJECUCIÓN: Servicio de Streaming de Radio Ciudadana activado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	2.0
63	EJECUCIÓN: Mantenimiento realizado a los Equipos de Cabinas para Radio Ciudadana en Quito, Guayaquil y Loja.	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Mantenimiento preventivo realizado de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (II Cuatrimestre).	5-Entregables Intermedios	03/12/2018	03/12/2018			No	4.0
65	EJECUCIÓN: Instalación realizada de nuevos equipos COMREX para la señal de contribución a nivel nacional.	5-Entregables Intermedios	17/12/2018	17/12/2018			No	2.0
66	EJECUCIÓN: Mantenimiento preventivo realizado de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (III Cuatrimestre).	5-Entregables Intermedios	21/12/2018	21/12/2018			No	4.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Repetidoras FM operando con equipos propios.		100.00 %	0.5	0.5	01/01/2018	May-Ago
2	Porcentaje de mantenimientos preventivos a la estaciones y plantas transmisoras de Radio Ciudadana FM y AM		101.02 %	0.66	0.6667	01/01/2018	May-Ago


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	350,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,853,789.05 **
Costo Total:	4,379,829.42
Total Devengado:	3,487,216.71
% Costo Total Devengado:	79.62 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 79.62 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,364,865.50	657,018.86	0.00	5,021,884.36
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	8,252,716.70	77,312.37	0.00	8,330,029.07
Ppto. Codificado	5,387,877.62	435,502.68	0.00	5,823,380.30
Ppto. Comprometido	3,619,776.13	203,076.29	0.00	3,822,852.42
Planeado - Codificado (2018)		221,516.18		
Programado a Devengar	9,351,123.59	569,457.87	0.00	9,920,581.46
Ppto. Devengado	3,284,331.18	202,885.53	0.00	3,487,216.71
Pagado Real	1,985,435.49	202,053.04	0.00	2,187,488.53
Estimado a fin de año	* 3,284,331.18	606,555.09	0.00	3,890,886.27
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	6,066,792.41	-37,097.22	0.00	6,029,695.19
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 35.12 %	35.63 %	0.00 %	35.15 %
Ppto. Codificado 998	157,528.63	0.00	0.00	157,528.63
Ppto. Devengado 998	157,528.63	0.00	0.00	157,528.63

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

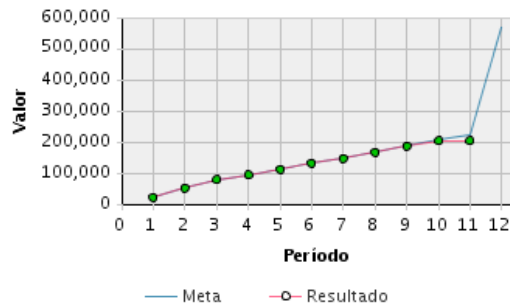

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	20,069.62	20,069.62	20,069.62	20,069.62	100.00 %	●	3.52 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	30,786.95	30,786.95	50,856.57	50,856.57	100.00 %		8.93 %
Mar	27,231.18	27,231.18	78,087.75	78,087.75	100.00 %		13.71 %
Abr	15,274.63	15,274.63	93,362.38	93,362.38	100.00 %		16.39 %
May	17,892.74	17,892.74	111,255.12	111,255.12	100.00 %		19.54 %
Jun	19,708.50	19,708.50	130,963.62	130,963.62	100.00 %		23.00 %
Jul	18,800.62	15,958.75	149,764.24	146,922.37	98.10 %		25.80 %
Ago	18,800.62	19,388.61	168,564.86	166,310.98	98.66 %		29.21 %
Sep	18,800.62	19,692.03	187,365.48	186,003.01	99.27 %		32.66 %
Oct	18,800.62	16,882.52	206,166.10	202,885.53	98.41 %		35.63 %
Nov	18,800.62	0.00	224,966.72	202,885.53	90.18 %		35.63 %
Dic	344,491.15		569,457.87				
Total	569,457.87	202,885.53					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6	Incrementar la audiencia de los mensajes y productos comunicacionales que se difunden de las actividades del Gobierno MEDIANTE la innovación permanente de contenidos y mecanismos de difusión.
---	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Cedula Presupuestaria Dic2014	PROYECTO_022.pdf	05/01/2015
2	Cedula Presupuestaria Enero2015	Enero2015.pdf	05/02/2015
3	Cedula Presupuestaria Febrero2015	Cédula_Presupuestaria_Radio_Ciudadana_Febrero_2015.pdf	10/03/2015
4	Cedula Presupuestaria Nov2014	PROYECTO_022.pdf	04/12/2014
5	Cedulas Presupuestarias 2014	Octubre2014.zip	04/11/2014
6	Cronograma de Instalación de Transmisores GYE y LOJA	cronograma_Tx_GYE_LOJA.xlsx	04/11/2014
7	EJECUCION: Informe de Radio La Ciudadana - 2018 Julio	Radio-Streaming-Unidad_Movil_-_David_Chavez.pdf	06/08/2018
8	HITO 10: Informe Enero 2015	Procesos_RC_2015.mpp	05/02/2015
9	HITO 11: Programación Indicativa Anual de Proyecto	Radio_Ciudadana_PIA_27-01-2015.xlsx	10/03/2015
10	HITO 12: Informe Febrero 2015	Procesos_RC_2015_Feb.mpp	10/03/2015
11	Hito 13: Proceso de trasmisor Quito cargado en el portal	Informe_Transmisor_Quito_Febrero.pdf	05/08/2015
12	HITO 14: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Marzo	Procesos_RC_2015_Mar.mpp	02/04/2015
13	HITO 16: Informe Abril 2015	Procesos_RC_2015_rev_05-05-15.mpp	05/05/2015
14	Hito 17: Procesos de infraestructura de oficinas de GYE y Loja cargado en el portal	Informe_Equipamiento_Guays_y_Loja_Abril-2.pdf	05/08/2015
15	HITO 18: Informe Mayo 2015	Procesos_RC_2015_rev_05-06-15.mpp	08/06/2015
16	Hito 19: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Junio elaborado	Informe_Quito_Junio_2015.pdf	05/08/2015
17	Hito 20: Informe de avance semestral elaborado	Informe_Quito_1er_Semestre_2015.pdf	05/08/2015
18	Hito 21: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Julio elaborado	Informe_Quito-Julio_2015.pdf	05/08/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	Hito 22: Informe firmado de contratación de pastillas comunicacionales para mejorar la grilla de programación	Informe_Contratacio	03/09/2015
20	Hito 23: Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Agosto elaborado	informe_Avance_Agosto_RC.pdf	03/09/2015
21	Hito 24: Informe EJECUCIÓN: Convenio firmado SECOB - SECOM para adecuación de infraestructura de oficinas de GYE y Loja	Informe_Convenio_SECOM_-_SECOB_Guayas_y_Loja_Agosto.pdf	03/09/2015
22	Hito 25 - Informe de avance de ejecución del convenio SECOB - SECOM para adecuación de infraestructura de oficinas de GYE y Loja	Informe_Convenio_SECOM_-_SECOB_Guayas_y_Loja_Septiembre-1.pdf	05/10/2015
23	Hito 26 - Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Septiembre elaborado	informe_de_Avance_Sep_RC.pdf	05/10/2015
24	Hito 27 - Informe firmado de mantenimiento y trabajos técnicos para el equipamiento de la radio	Informe_MANTENIMIENTO.pdf	05/11/2015
25	Hito 28 - Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Octubre elaborado	Informe_GPR_Octubre2015.pdf	05/11/2015
26	Hito 29 - Informe de avance de ejecución del convenio SECOB - SECOM para adecuación de infraestructura de oficinas de GYE y Loja	Informe_Convenio_SECOM_-_SECOB_Guayas_y_Loja_Noviembre-2.pdf	04/12/2015
27	HITO 30 - Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Noviembre elaborado	Informe_de_Avances_30-11-15.pdf	04/12/2015
28	Hito 31 - Instalación de trasmisores Quito entregada	Informe_TXQUITO_entregado.pdf	04/01/2016
29	Hito 32 - Informe de análisis de nueva cobertura de la radio	INFORME_DE_NUEVA_COBERTURA_RC.pdf	04/01/2016
30	Hito 33 - Informe de avance de ejecución del proyecto del mes de Diciembre elaborado	Informe_de_avances_diciembre.pdf	04/01/2016
31	Hito 34 - Informe de planificación anual entregado	INFORME_PLANIFICACION_2016-RC.pdf	15/03/2016
32	Hito 35 - TDRs de Streaming elaborados	Informe_Streaming_TDR.pdf	15/03/2016
33	HITO 36 - TDRS de Arrendamiento de sistemas de radiodifusión	TDR_ALQUILER_5_ESTACIONES_FM.pdf	04/04/2016
34	Hito 37 - Servicio de Streaming adjudicado	Informe_streaming_RC.pdf	03/05/2016
35	HITO 38 - Arrendamiento de sistemas de radiodifusión adjudicado	INFORME_ARRENDAMIENTO_DE_SISTEMAS_DE_RADIODIFUSION ADJUDICADO_310516.pdf	03/05/2016
36	HITO 39 - Equipos de radiodifusión reubicados	Informe_de_reubicación_de_equipos.pdf	01/07/2016
37	HITO 3: Informe OCTubre 2014	INFORME_DE_DE_GESTION_RADIO_CIUDADANA.docx	04/12/2014
38	HITO 40 - Informe Sobre servicio de streaming contratado	InformeStreaming_30-07-16_FINAL.pdf	02/08/2016
39	HITO 41 - Sistemas de radiodifusión arrendados	INFORME_SISTEMAS_DE_RADIODIFUSIÓN_ARRENDADOS_081016.pdf	08/10/2016
40	HITO 42 - TDRs para la producción de pastillas informativas elaborados	INFORME_TDR_PASTILLAS.pdf	01/09/2016
41	HITO 43 - Producción de pastillas informativas contratadas	INFORME_PASTILLAS_30-09-16.pdf	03/10/2016
42	HITO 44 - Informe del servicio de Streaming funcionando entregado	INFORME_STREAMING_ENTREGADO-1.pdf	01/11/2016
43	HITO 45 - Informe del Arrendamiento de sistemas de radiodifusión	INFORME_DE_SISTEMAS_DE_RADIODIFUSION-1.pdf	02/12/2016
44	HITO 46 Informe anual del proyecto	INFORME_ANUAL_PROYECTO_30-12-16-1.pdf	03/01/2017
45	HITO 47 - Informe firmado de catalogación y automatización de contenidos de Radio Ciudadana, instalación de nuevas consolas de audio y NAS para el Proyecto	INFORME_HITO_CONSOLAS_AUTOMATIZACION-1.pdf	03/02/2017
46	HITO 48 - Presupuesto anual aprobado para el Proyecto de Radio Ciudadana	INFORME_PRESUPUESTO_APROBADO.pdf	02/03/2017
47	HITO 49 - Convenio firmado con RTV Ecuador para la operación de 5 estaciones de Radio Ciudadana en su Infraestructura	INFORME_HITO_CONVENIO_ECTV.pdf	03/04/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
48	HITO 4: Informe Noviembre 2014	INFORME_DE_DE_GESTION_RADIO_CIUADADANA.docx	04/12/2014
49	HITO 50 - Informe firmado de mantenimiento preventivo de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (I Cuatrimestre)	Informe_de_mantenimiento_equipos_transmisores_Radio_Ciudadana.pdf	02/05/2017
50	HITO 51 - Informe firmado de activación del servicio de Streaming de Radio Ciudadana	Informe_No_0501_Informe_de_activación_de_streaming_31052017.pdf	05/26/2017
51	Hito 52 - Informe firmado de habilitación de enlaces de datos de respaldo y Monitoreo para todos los enlaces de datos de Radio Ciudadana	Informe_No_0602_Informe_de_enlaces_de_respaldo.pdf	03/07/2017
52	HITO 53 - Contrato firmado de Adquisición, instalación y puesta en marcha de 5 estaciones de Radio FM adjudicado	Informe_No_0701_Informe_de_adquisición_instalación_y_puesta_en_marcha_de_5_estaciones_fm.pdf	03/08/2017
53	HITO 54 - Informe firmado de mantenimiento preventivo de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (II Cuatrimestre)	INFORME_MANTENIMIENTO_II_CUATRIMESTRE.pdf	01/09/2017
54	HITO 55 - Informe firmado de instalación de nuevos equipos COMREX para la señal de contribución a nivel nacional	Informe_No_0901_Informe_de_instalación_de_nuevos_equipos_comrex.pdf	02/10/2017
55	HITO 57 - Informe firmado de mantenimiento preventivo de los equipos Transmisores de Radio Ciudadana en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja (III Cuatrimestre)	Informe_No_1101_Informe_de_mantenimiento_equipos_III_Cuatrimestre.pdf	04/12/2017
56	HITO 5: Informe de consultoría de diseño de oficinas de GYE por parte de SECOB	Presupuesto_Gquil._Oficinas.xlsx	02/04/2015
57	HITO 5: Informe de consultoría de diseño de oficinas de LOJA por parte de SECOB	Presupuesto-Loja_Oficinas.xlsx	02/04/2015
58	Hito 63 - Informe de Radio La Ciudadana - 2018 Junio	Informe_de_Radio_La_Ciudadana_-_2018_Junio.pdf	04/07/2018
59	HITO 7:Informe Diciembre y Cierre	INFORME_DE_DE_GESTION_RADIO_CIUADADANA.docx	05/01/2015
60	HITO 8: Informe procesos liquidados	INFORME_TÉCNICO_PARA_LA_PUESTA_EN_MARCHA_DE_5_TRANSMISOR_EN_GUAYAQUIL.pdf	05/02/2015
61	Informe de transmisiones en vivo - 2018 Agosto	Transmisiones_en_vivio_-_David_Chávez.pdf	06/09/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Khalife Moraga, Galo Miguel	Líder del Proyecto	ex Gerente de Proyecto	galo.khalife@secom.gob.ec	
